PREPD 2026/2027


Planeamento da Dissertação

Exemplo de WBS


Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Estrutura da EAP / WBS por ciclo de vida

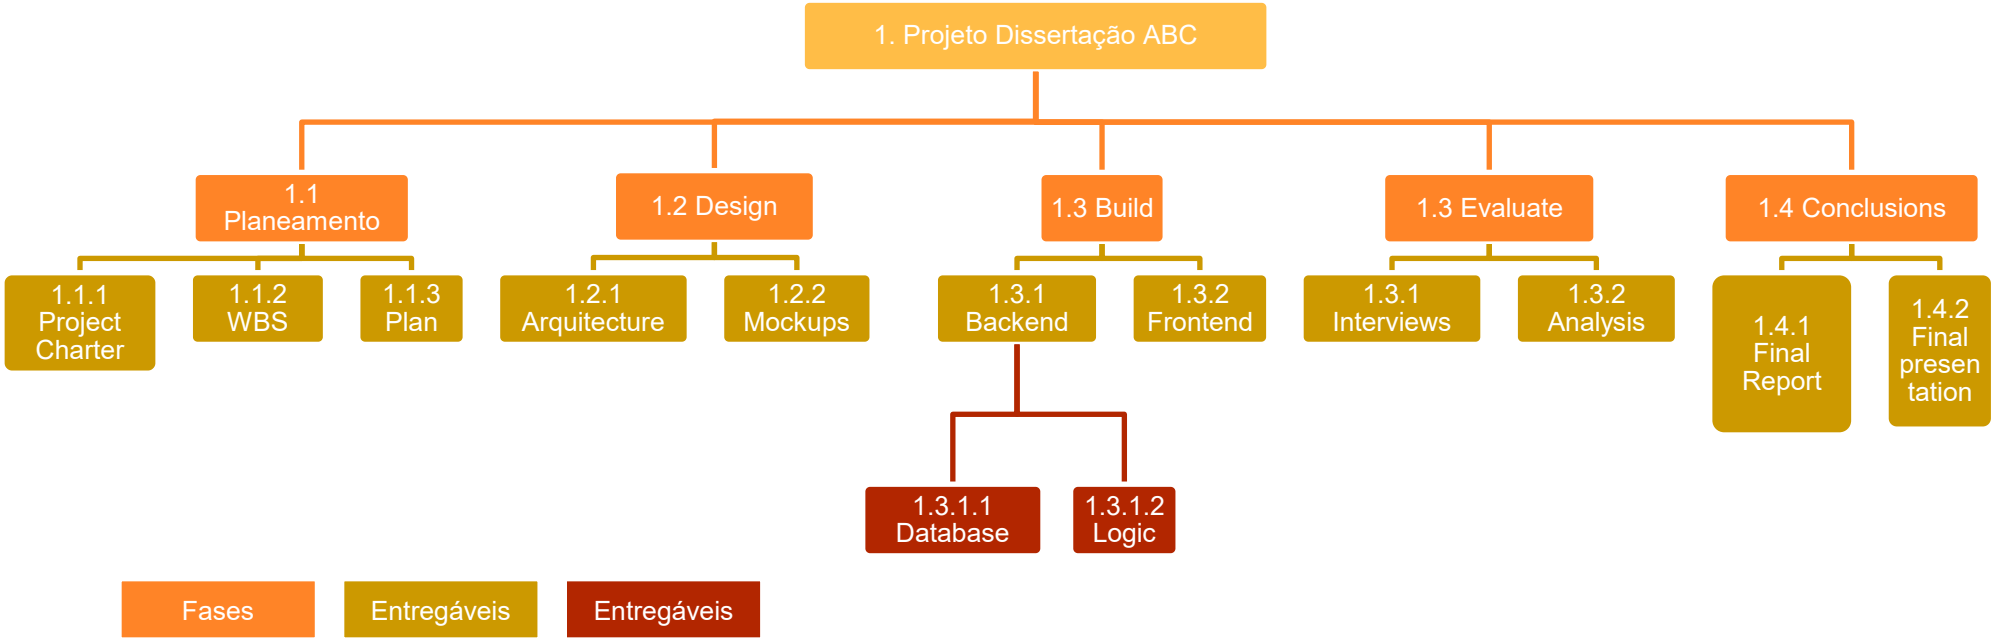


Cronograma do Projeto

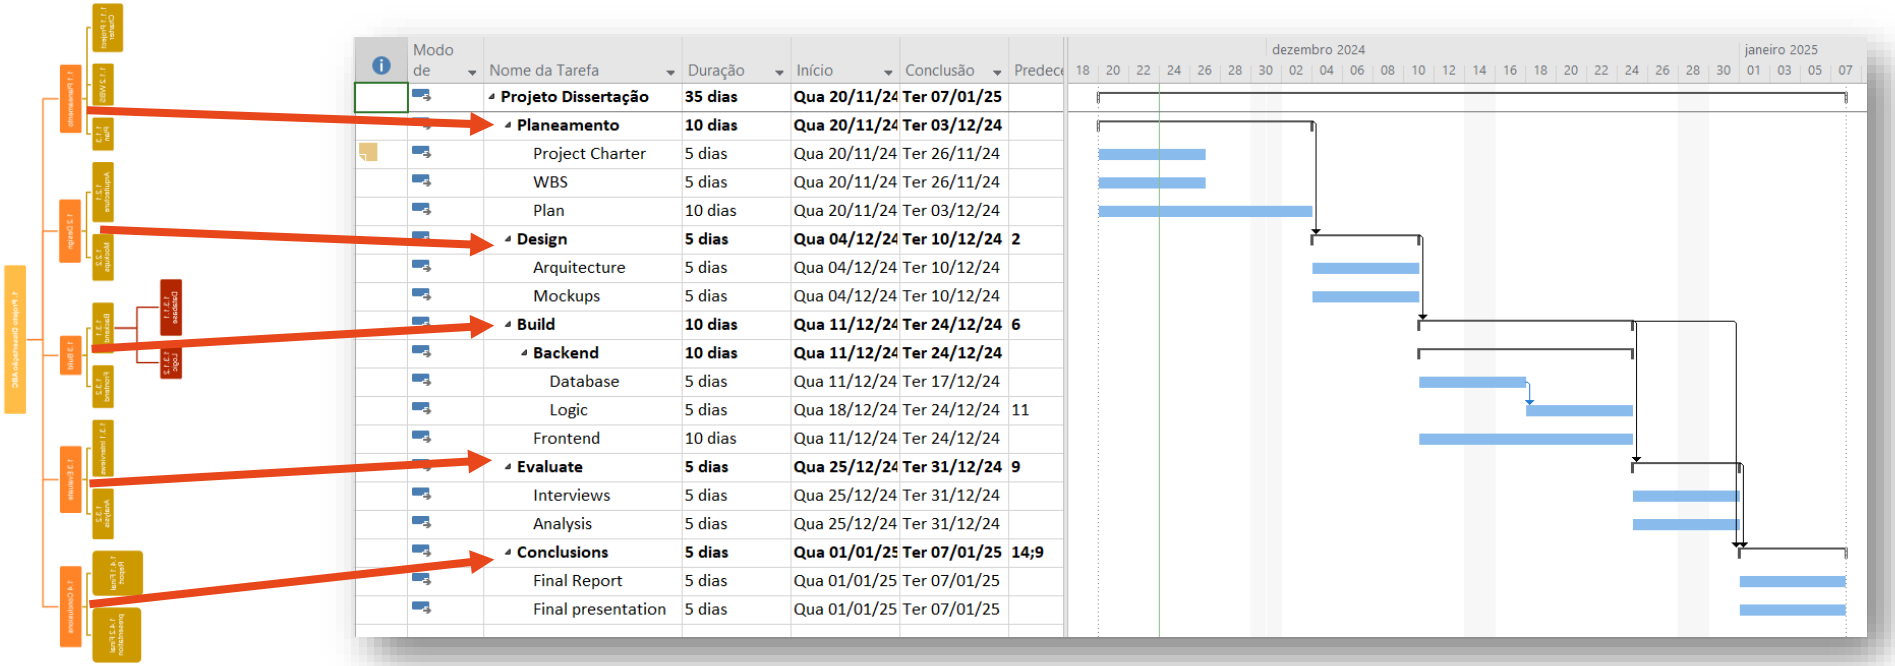

Modo de	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predec
	Projeto Dissertação	**35 dias**	**Qua 20/11/24**	**Ter 07/01/25**	
	Planeamento	**10 dias**	**Qua 20/11/24**	**Ter 03/12/24**	
	Project Charter	5 dias	Qua 20/11/24	Ter 26/11/24	
	WBS	5 dias	Qua 20/11/24	Ter 26/11/24	
	Plan	10 dias	Qua 20/11/24	Ter 03/12/24	
	Design	**5 dias**	**Qua 04/12/24**	**Ter 10/12/24**	**2**
	Arquitecture	5 dias	Qua 04/12/24	Ter 10/12/24	
	Mockups	5 dias	Qua 04/12/24	Ter 10/12/24	
	Build	**10 dias**	**Qua 11/12/24**	**Ter 24/12/24**	**6**
	Backend	**10 dias**	**Qua 11/12/24**	**Ter 24/12/24**	
	Database	5 dias	Qua 11/12/24	Ter 17/12/24	
	Logic	5 dias	Qua 18/12/24	Ter 24/12/24	11
	Frontend	10 dias	Qua 11/12/24	Ter 24/12/24	
	Evaluate	**5 dias**	**Qua 25/12/24**	**Ter 31/12/24**	**9**
	Interviews	5 dias	Qua 25/12/24	Ter 31/12/24	
	Analysis	5 dias	Qua 25/12/24	Ter 31/12/24	
	Conclusions	**5 dias**	**Qua 01/01/25**	**Ter 07/01/25**	**14;9**
	Final Report	5 dias	Qua 01/01/25	Ter 07/01/25	
	Final presentation	5 dias	Qua 01/01/25	Ter 07/01/25	

Cronograma do Projeto (detalhado)

	Modo de	WBS	Nome da Tarefa	Nível WBS	Duração	Início	Conclusão
1		**1**	**Projeto Dissertação**	**Projeto**	**70 dias**	**Seg 03/02/25**	**Sex 09/05/25**
2		**1.1**	**Planeamento**	**Fase**	**10 dias**	**Seg 03/02/25**	**Sex 14/02/25**
3		1.1.1	Project Charter	Entregável	5 dias	Seg 03/02/25	Sex 07/02/25
4		1.1.2	WBS	Entregável	5 dias	Seg 03/02/25	Sex 07/02/25
5		1.1.3	Plan	Entregável	10 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/02/25
6		**1.2**	**Design**	**Fase**	**10 dias**	**Seg 17/02/25**	**Sex 28/02/25**
7		1.2.1	Arquitecture	Entregável	5 dias	Seg 17/02/25	Sex 21/02/25
8		1.2.2	Mockups	Entregável	5 dias	Seg 24/02/25	Sex 28/02/25
9		**1.3**	**Build**	**Fase**	**20 dias**	**Seg 03/03/25**	**Sex 28/03/25**
10		**1.3.1**	**Backend**	**Entregável**	**10 dias**	**Seg 03/03/25**	**Sex 14/03/25**
11		1.3.1.1	Database	Tarefa	5 dias	Seg 03/03/25	Sex 07/03/25
12		1.3.1.2	Logic	Tarefa	5 dias	Seg 10/03/25	Sex 14/03/25
13		1.3.1.3	Interviews request	Tarefa	1 dia	Sex 14/03/25	Sex 14/03/25
14		1.3.2	Frontend	Entregável	10 dias	Seg 17/03/25	Sex 28/03/25
15		**1.4**	**Evaluate**	**Fase**	**15 dias**	**Seg 31/03/25**	**Sex 18/04/25**
16		1.4.1	Interviews	Entregável	10 dias	Seg 31/03/25	Sex 11/04/25
17		1.4.2	Report version 0.1	Entregável	10 dias	Seg 31/03/25	Sex 11/04/25
18		1.4.3	Analysis	Entregável	5 dias	Seg 14/04/25	Sex 18/04/25
19		**1.5**	**Conclusions**	**Fase**	**15 dias**	**Seg 21/04/25**	**Sex 09/05/25**
20		1.5.1	Final Report	Entregável	10 dias	Seg 21/04/25	Sex 02/05/25
21		1.5.2	Report Validation	Entregável	5 dias	Seg 05/05/25	Sex 09/05/25
22		1.5.3	Final presentation	Entregável	5 dias	Seg 05/05/25	Sex 09/05/25
23		**1.6**	**Milestones**	**Milestones**	**60 dias**	**Sex 14/02/25**	**Sex 09/05/25**
24		1.6.1	Plan delivered	Milestones	0 dias	Sex 14/02/25	Sex 14/02/25
25		1.6.2	Mockups Finished	Milestones	0 dias	Sex 28/02/25	Sex 28/02/25
26		1.6.3	Software finished	Milestones	0 dias	Sex 28/03/25	Sex 28/03/25
27		1.6.4	Report 0.1 delivered	Milestones	0 dias	Sex 11/04/25	Sex 11/04/25
28		1.6.5	Inte. Analysis finished	Milestones	0 dias	Sex 18/04/25	Sex 18/04/25
29		1.6.6	Final report delivered	Milestones	0 dias	Sex 02/05/25	Sex 02/05/25
30		1.6.7	Presentadion date	Milestones	0 dias	Sex 09/05/25	Sex 09/05/25

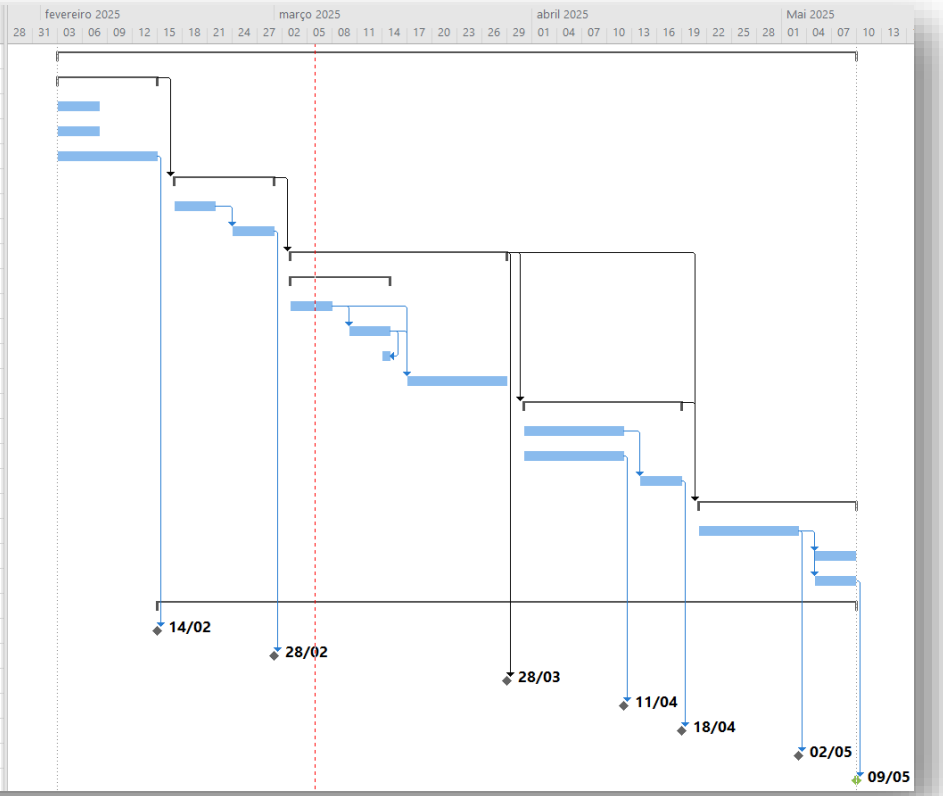

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

Planeamento da Dissertação

Template da WBS

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt
